

社会資本総合整備計画 事後評価書(中間評価書)

平成 28 年 3 月 3 日

計画の名称	佐用町における循環のみちの実現									
計画の期間	平成24年度 ～ 平成26年度 (3年間)			交付対象	佐用町					
計画の目標	集合処理区域の統廃合により汚水処理の効率化を図る。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>効率的な汚水処理が図られるよう全体計画を見直し整備計画を策定する。</li> <li>江川地区 (農集) を佐用処理区と統合し佐用処理区の処理面積を164.2ha から190ha に拡大する。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値		備考	
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>佐用処理区統合区域実施率 既存面積 (164.2ha) / 新規面積 (25.8ha)</li> </ul>						86.4%	86.4%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	81百万円	A	81百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期

事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
佐用町上下水道課において実施	平成27年度実施
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1	下水道	一般	佐用町	直接	-	汚水	全種	効率的な汚水処理整備計画策定事業	整備計画策定	佐用町						13	
A2	下水道	一般	佐用町	直接	-	汚水	新設	佐用地区排水整備事業 (污水管)	φ100 L=493m φ75 L=290m	佐用町						5	
A3	下水道	一般	佐用町	直接	-	汚水	新設	佐用地区排水整備事業 (マンホールポンプ)	MP7基	佐用町						5	
											合計	81					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	


※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・汚水処理施設の効率化を目指し佐用処理区・上月処理区の統廃合事業について事業計画を変更することが出来た。													
II 定量的指標の達成状況		指標①（佐用処理区統合区域実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	当初、佐用処理区へ統合を予定している農業集落排水施設2か所のうち1ヶ所（25.8ha）統合を計画していたが、2地区（71.2ha）同時に工事を着手した方が合理的であるため工程を変更し調査、設計まで実施したため。									
			最終実績値	86.4%											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設マンホールポンプ場の必要規模を検査し改築について検討することが出来た。</li> <li>・統合予定の農集排水処理施設の有効利用について検討することが出来た</li> </ul>													
3. 特記事項（今後の方針等）															
今回策定した事業計画及び調査・設計内容に基づき新たな社会資本総合整備計画【佐用町における循環のみちの実現（2） 期間：H27～H31】にて工事を着手する。															

計画名称	1 佐用町における循環のみの実現		
計画の期間	平成24年度～平成26年度(3年間)	交付対象	兵庫県佐用町

(町内全域)

A2・3佐用地区排水整備事業

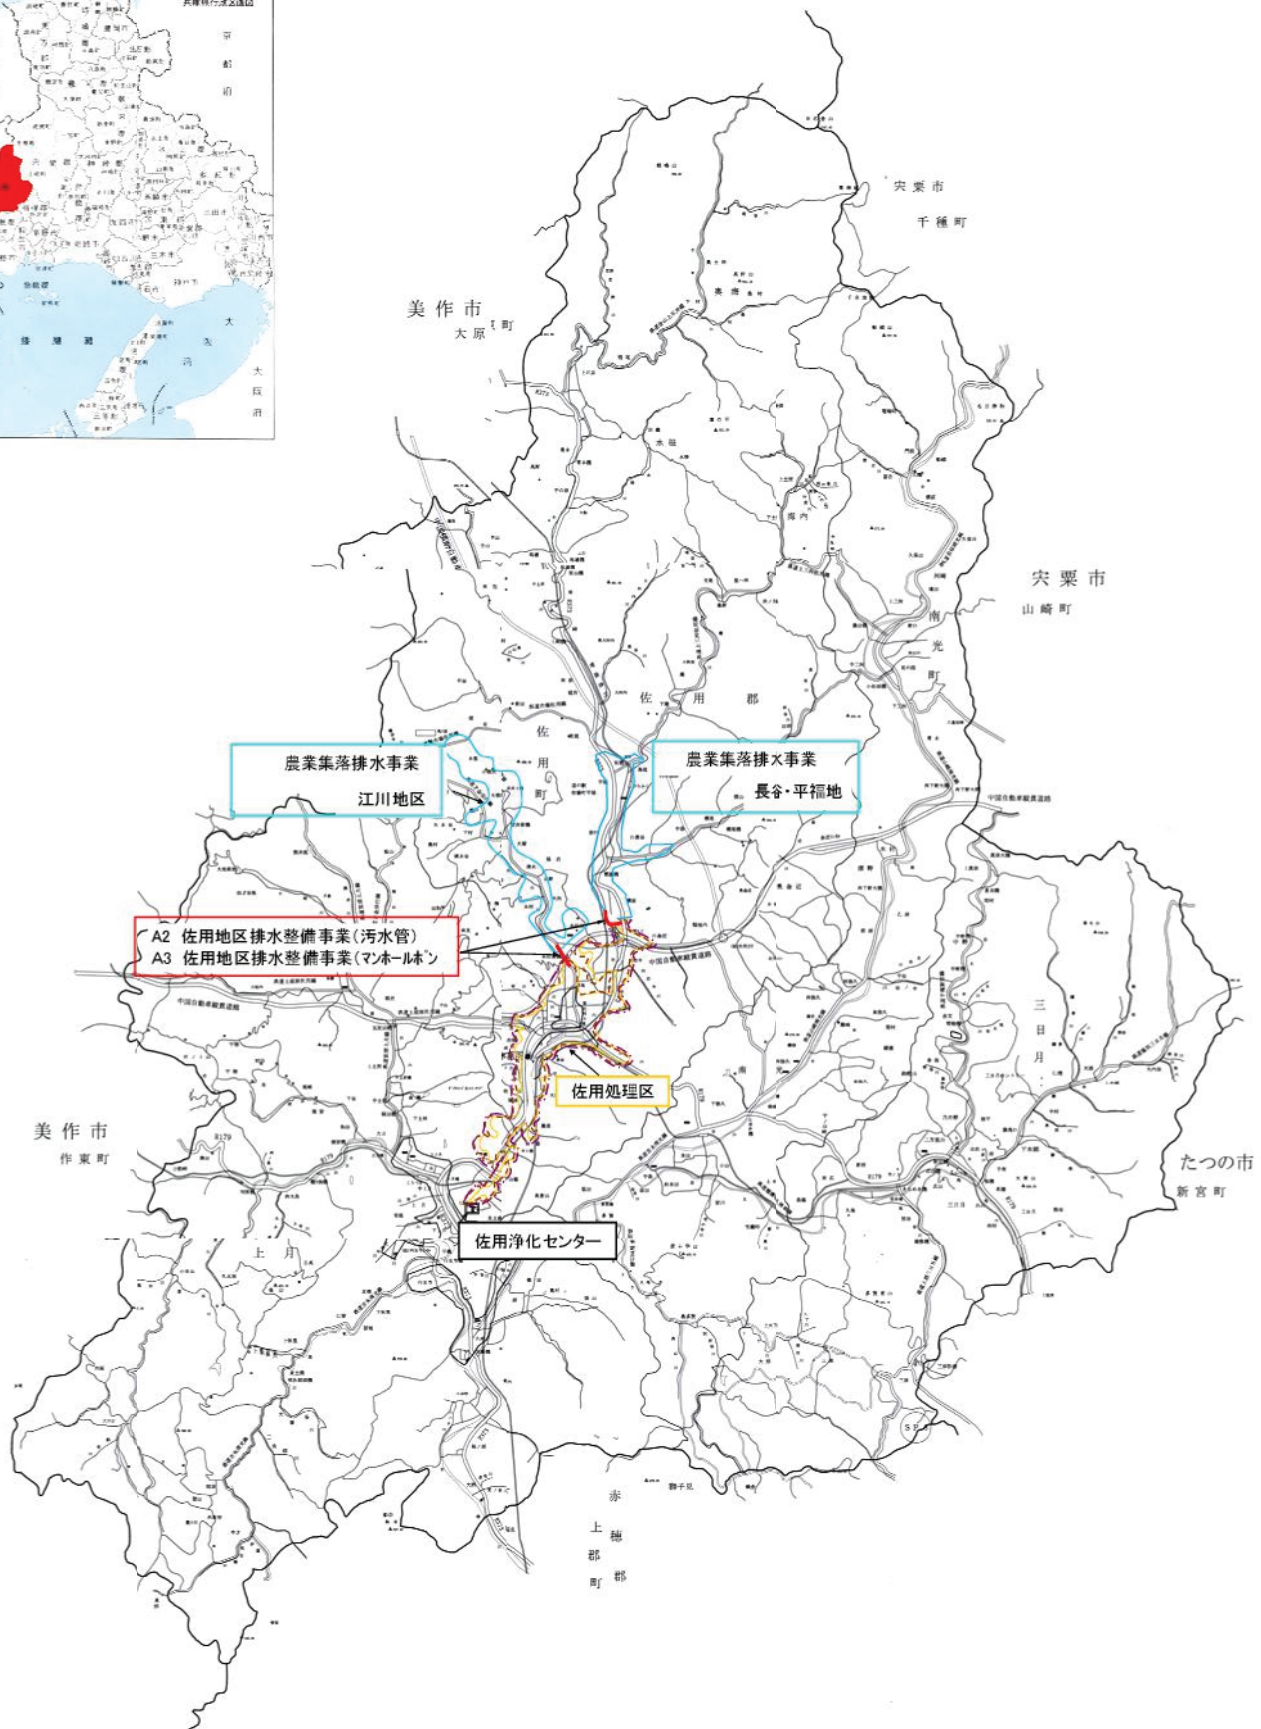

凡		例	
区	城	色別	簡
特定埋立 保安公共 下水道事 業	佐用処理区 埋立区域界	黄色 ---	0.5mmの破線
	埋立区域	---	0.5mmの一重破線
農業集落 排水整備	江川地区	青	
